



TP 3: Préparer un projet

Activité 1 : Étude de cas pour un projet de développement Web

Contexte : Une petite entreprise souhaite créer un site web e-commerce pour vendre ses produits en ligne. Le projet inclut la création de la page d'accueil, une section de catalogue produit, un système de panier d'achat et de paiement, ainsi qu'une section de contact. Ce site doit également être responsive pour s'adapter aux appareils mobiles.

Informations générales :

- Objectif du projet : Créer un site web permettant aux clients d'acheter des produits en ligne de manière intuitive et sécurisée.
- Durée estimée : 8 semaines
- Équipe : Chef de projet, développeur front-end, développeur back-end, designer UX/UI, rédacteur de contenu, spécialiste SEO.

Tâches suggérées pour l'organigramme des tâches :


1. Analyse des besoins - Consultation du client pour définir les fonctionnalités principales du site.
2. Création de la maquette - Le designer UX/UI réalise les maquettes du site pour la validation client.
3. Développement front-end - Le développeur front-end crée les pages en HTML, CSS, et JavaScript.
4. Développement back-end - Le développeur back-end implémente la gestion des produits, le panier et le paiement.
5. Intégration des contenus - Le rédacteur ajoute les textes, descriptions de produits, et optimise les balises SEO.
6. Tests et validation - Tests de navigation et de paiement, assurance de compatibilité avec les navigateurs et appareils mobiles.
7. Mise en production - Déploiement du site et vérifications finales.

Objectif : Utilisez ces informations pour créer un organigramme des tâches, en incluant les dépendances entre chaque tâche afin de structurer le projet efficacement.

Activité 2 : Diagramme de Pert et Table des Tâches

Contexte : Une entreprise de services informatiques prévoit de lancer une application mobile de gestion de tâches. Le projet comporte des branches parallèles et des tâches interdépendantes pour rendre la gestion du projet plus complexe.

Mermaid Code pour l'organigramme des tâches : Utilisez ce code pour visualiser l'organigramme des tâches à l'aide de Mermaid.

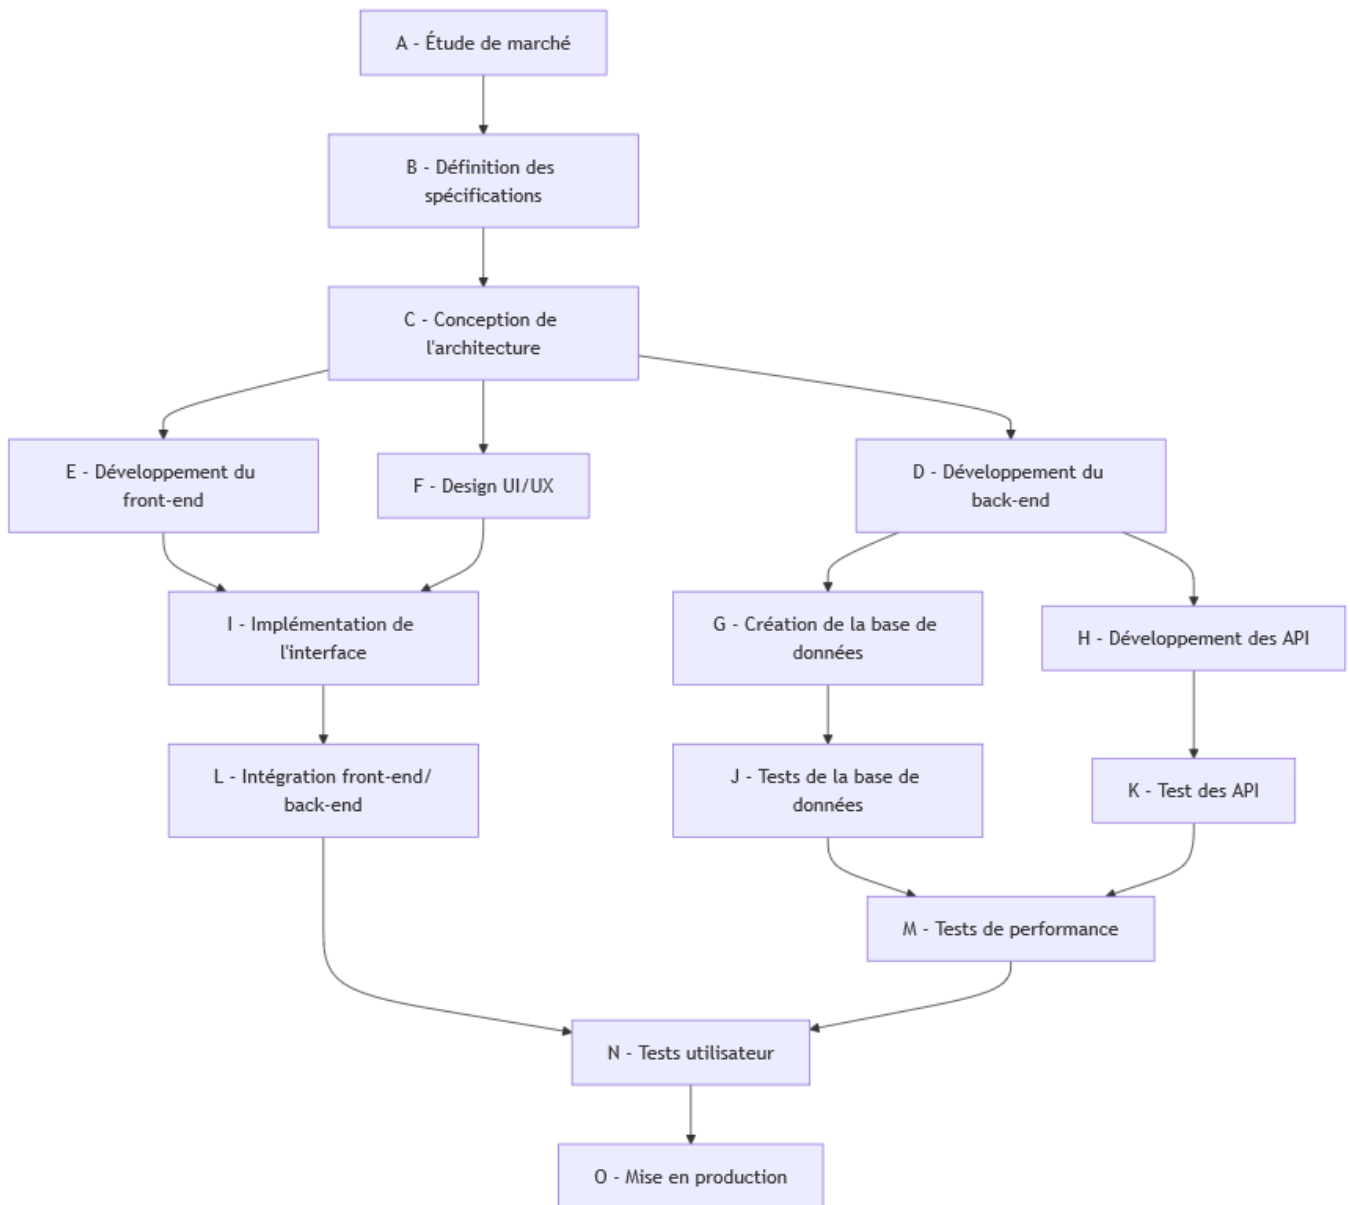

Instructions :

1. Remplir le tableau des tâches : Remplissez les colonnes du tableau ci-dessous en estimant la durée (en jours) de chaque tâche et en indiquant les tâches antérieures.

Nom de la tâche	Tâche	Durée (jours)	Tâches Antérieures
A	Étude de marché		
B	Définition des spécifications		
C	Conception de l'architecture		
D	Développement du back-end		
E	Développement du front-end		
F	Design UI/UX		
G	Création de la base de données		
H	Développement des API		
I	Implémentation de l'interface		
J	Tests de la base de données		
K	Test des API		
L	Intégration front-end/back-end		
M	Tests de performance		
N	Tests utilisateur		
O	Mise en production		

2. Créer le Diagramme de Pert : En utilisant le tableau ci-dessus, construisez un diagramme de Pert pour visualiser les dépendances et l'ordre des tâches.
3. Calcul des marges (MT et ML) : Calculez les marges totales et libres pour chaque tâche afin d'identifier les tâches critiques.
4. Diagramme de Gantt : Sur la base de vos estimations de durée et des dépendances, créez un diagramme de Gantt montrant le déroulement du projet dans le temps.
5. Définir le Chemin Critique : Identifiez le chemin critique et les tâches critiques, c'est-à-dire les tâches qui doivent impérativement être réalisées dans les délais pour respecter la date de fin du projet.

Activité 3 : Étude de cas avancée pour la planification de projet

Contexte : Une entreprise technologique lance un projet pour développer une plateforme de formation en ligne avec des modules interactifs, des forums de discussion, des quiz, et un système de gestion des utilisateurs. Le projet inclut plusieurs sous-projets interconnectés avec des dépendances complexes.

Tableau des tâches :

Lettre de tâche	Tâche	Durée (jours)	Tâches Antérieures
A	Étude de faisabilité	5	
B	Analyse des besoins	7	A
C	Conception de l'architecture de la plateforme	10	B
D	Développement du module de gestion des utilisateurs	15	C
E	Développement du module de contenu interactif	12	C
F	Conception de la base de données	8	B
G	Développement du système de quiz	9	E
H	Intégration du design UX/UI	6	C, F
I	Configuration des serveurs et infrastructure	7	F
J	Intégration de la base de données avec la gestion des utilisateurs	10	D, F
K	Implémentation de la fonctionnalité de forum de discussion	8	H, E
L	Tests du module de gestion des utilisateurs	5	J
M	Tests de la base de données	4	J
N	Tests de sécurité	6	I, J, K
O	Tests du système de quiz et contenu interactif	5	G, K
P	Tests de la plateforme complète	8	L, M, N, O
Q	Mise en production	3	P

Objectifs : À partir du tableau des tâches fourni, complétez les éléments suivants :

1. Créer un diagramme de Pert : Visualisez les dépendances et l'ordre des tâches dans un diagramme de Pert pour structurer le projet.
2. Créer un diagramme de Gantt : En utilisant les durées et les dépendances des tâches, construisez un diagramme de Gantt montrant le calendrier du projet.
3. Calculer les marges (ML et MT) : Calculez les marges totales et libres pour les tâche (F - J - K - N).
4. Déterminer le chemin critique : Identifiez le chemin critique ainsi que les tâches critiques pour garantir la réussite du projet dans les délais impartis.
